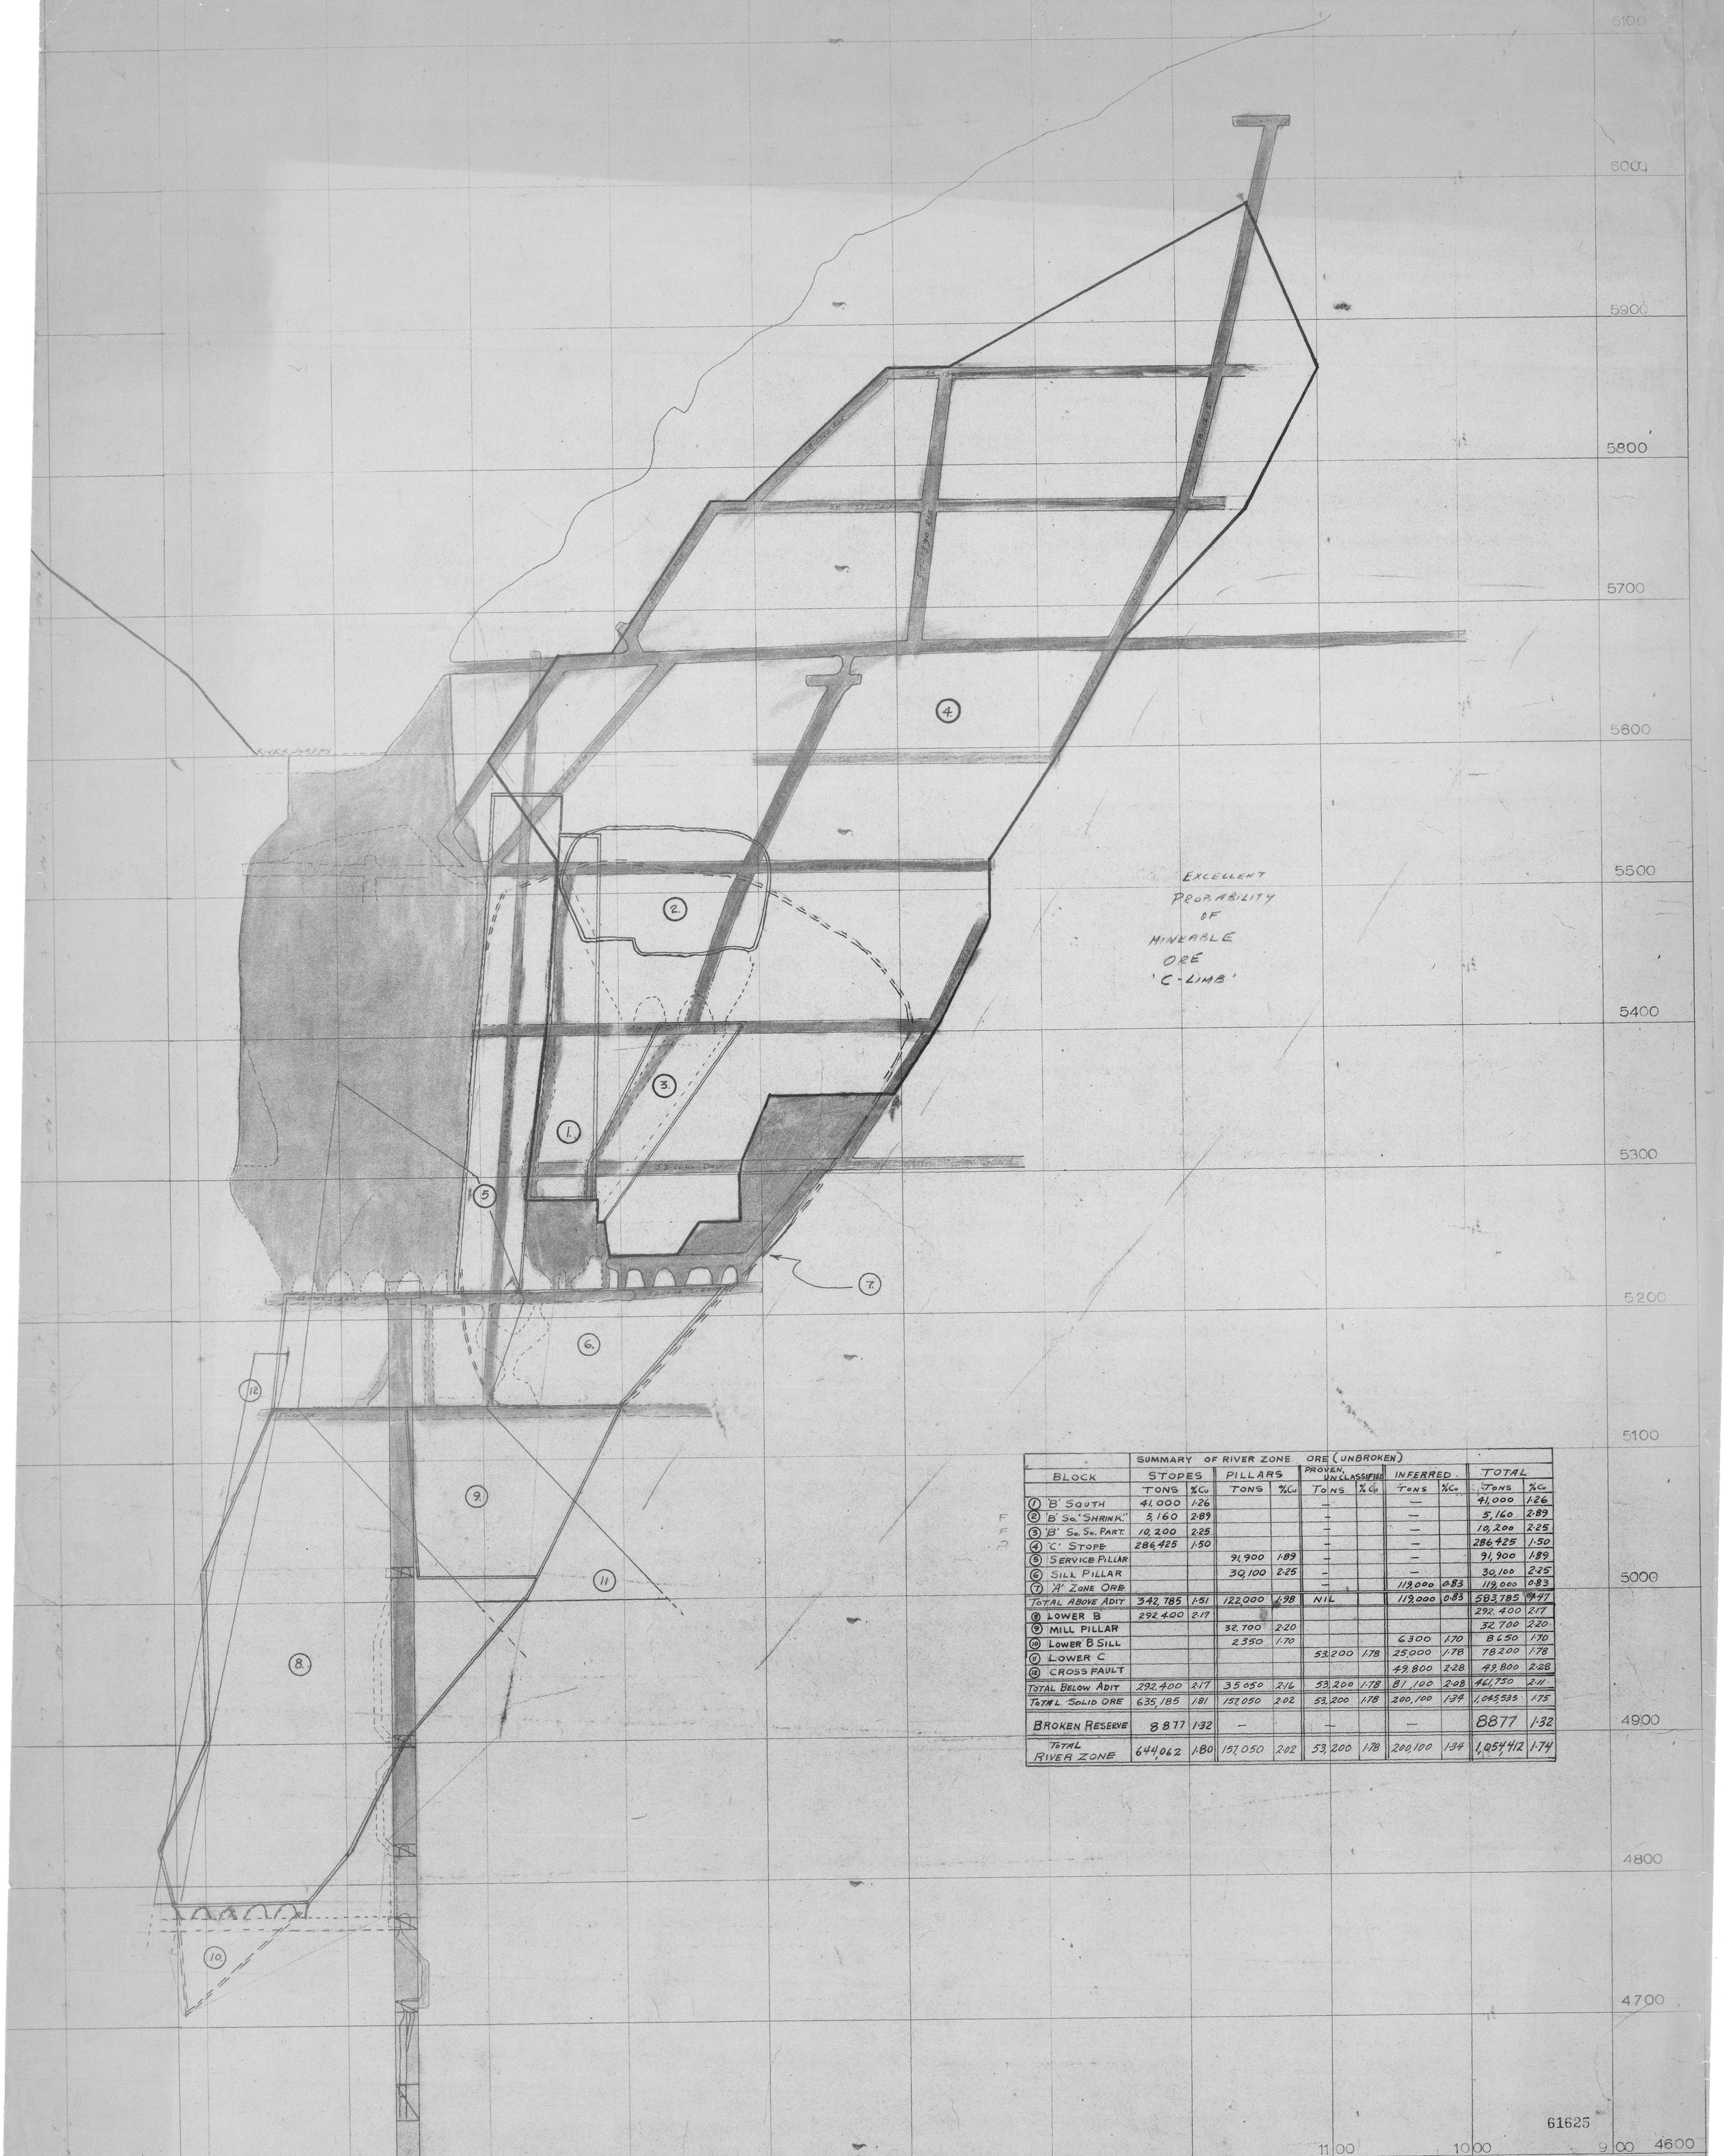

BLOCK	SUMMARY OF RIVER ZONE ORE (UNBROKEN) STOPES TONS	STOPES %Cu	PILLARS TONS	PILLARS %Cu	PROVEN, UNCLASSIFIED TONS	PROVEN, UNCLASSIFIED %Cu	INFERRED TONS	INFERRED %Cu	TOTAL TONS	TOTAL %Cu
(1) 'B' SOUTH	41,000	1·26			—		—		41,000	1·26
(2) 'B' So. 'SHRINK.'	5,160	2·89			—		—		5,160	2·89
(3) 'B' So. So. PART.	10,200	2·25			—		—		10,200	2·25
(4) 'C' STOPE	286,425	1·50			—		—		286,425	1·50
(5) SERVICE PILLAR			91,900	1·89	—		—		91,900	1·89
(6) SILL PILLAR			30,100	2·25	—		—		30,100	2·25
(7) 'A' ZONE ORE					—		119,000	0·83	119,000	0·83
TOTAL ABOVE ADIT	342,785	1·51	122,000	1·98	NIL		119,000	0·83	583,785	1·47
(8) LOWER B	292,400	2·17							292,400	2·17
(9) MILL PILLAR			32,700	2·20					32,700	2·20
(10) LOWER B SILL			2350	1·70			6300	1·70	8650	1·70
(11) LOWER C					53,200	1·78	25,000	1·78	78,200	1·78
(12) CROSS FAULT							49,800	2·28	49,800	2·28
TOTAL BELOW ADIT	292,400	2·17	35,050	2·16	53,200	1·78	81,100	2·08	461,750	2·11
TOTAL SOLID ORE	635,185	1·81	157,050	2·02	53,200	1·78	200,100	1·34	1,045,535	1·75
BROKEN RESERVE	8877	1·32	—		—		—		8877	1·32
TOTAL RIVER ZONE	644,062	1·80	157,050	2·02	53,200	1·78	200,100	1·34	1,054,412	1·74

ORE RESERVES - RIVER ZONE

COWICHAN COPPER CO.

SUNRO MINE

LONGITUDINAL SECTION

JAN. 1964

SCALE 1" = 40'

750672

61625

12
